


Kerngroep techniek

OKx · Npuls · 1 september 2026



Stand van zaken



Gesloten sinds 19 augustus: 9

- Requirementsboom overgeheveld: [#33](#)
- Id-conventie voor eisen: [#37](#), [#38](#)
- Leesroute en verdieping per rij: [#60](#), [#69](#), [#70](#)
- Engelse veldnamen in de schema's: [#8](#)
- LMS-koppelvlakplaat gecorrigeerd: [#48](#), review-opmerking verwerkt: [#28](#)

Ter review

- [PR 82](#): release v0.0.2

Opdrachten vorige sessie

OPDRACHT	STAND
De architectuurbesluiten doorlezen	Nog geen reacties binnen
Het referentiemateriaal doornemen: kaderscenario, persona, principes	Nog geen reacties binnen
Structuur en navigeerbaarheid beproeven, bevindingen als issue	Drie issues van buiten het projectteam

De vraag vandaag: is er tijd voor geweest, en wat is ervoor nodig om dit wel te laten lukken?



Waar het materiaal staat

Om te lezen

- [Architectuurbesluiten](#): 26 besluiten, alle met status voorstel
- [Kaderscenario leerroute 1](#): de keten van begin tot eind
- [Persona Jochem](#): de student die door dat scenario loopt

Om op te bouwen

- [Principes en uitgangspunten](#): waarom en hoe
 - [Requirementsboom](#): van doel naar eis
 - [Koppelvlakspecificaties](#): het releasepakket
- 

Open werk

Vijf milestones met openstaand werk

MILESTONE	OPEN
Releaseproces en kwaliteit	10
Requirementsboom doorontwikkelen	9
Interactiepatroon-documenten	7
Leerroute-refactor	4
Keuzedelen	3

Vermoedelijk werk zonder issue

- Informatiemodel eerst reviewen, dan de payloads
- Supporttermijn en deprecatie: AP06 belooft het, het releasedocument sluit het uit
- Eigenaarschap en RACI van het releasepakket: het template is er, nooit ingevuld

Voortgang issues vorige meeting


ITEM	VERVOLGACTIE
#47 versionering tussen koppelingen	Voorstel volgt als pull request
#51 releases via pull request	Ingericht, PR 82 loopt deze route
#45 klikbare referenties	Deels opgenomen in de requirementsboom
#46 tags van releases bewaren	Opgelost via de release branches; issue nog bij te werken
#44 werkwijze issuesessie	Nog niet opgepakt
Informatiemodel eerst reviewen, dan payloads	Geen issue, dus niet opgepakt

DEEL 1

Voortgang



Requirementsboom

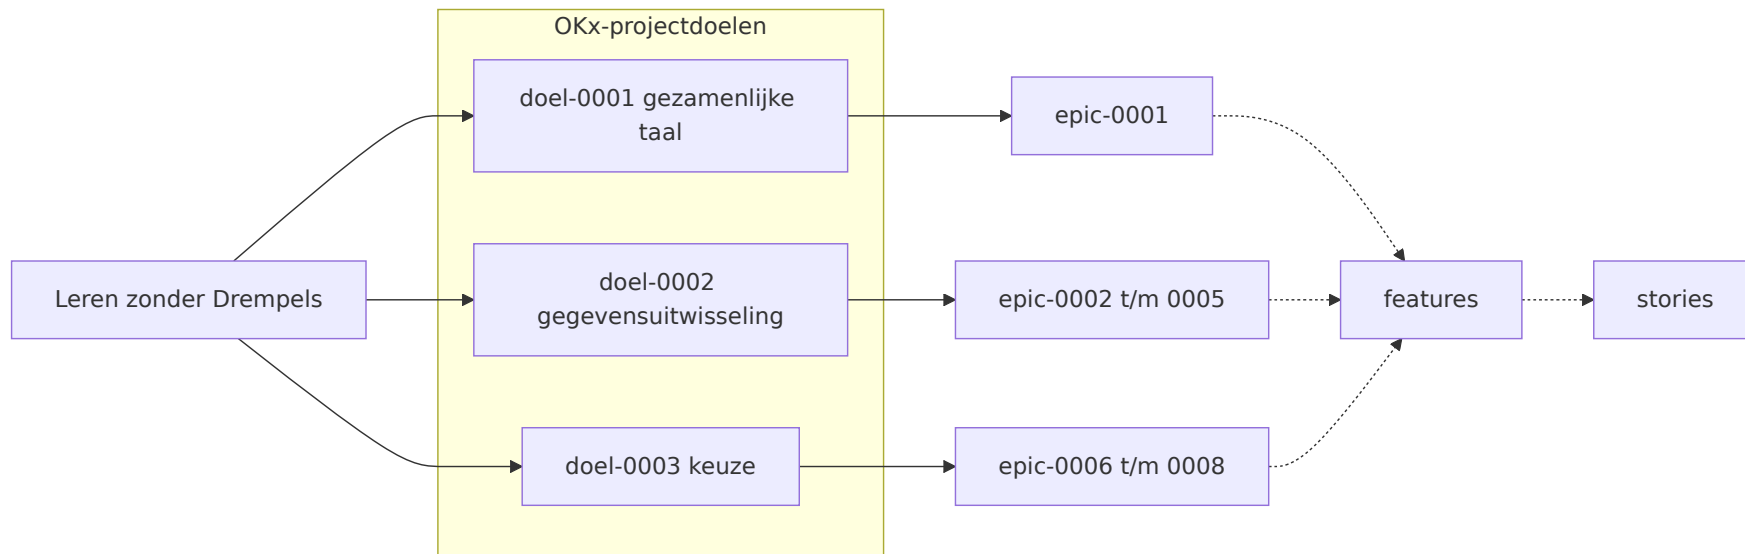

- De structuur staat: van doel via epic en feature naar story, en door naar de eis
- Klikbaar in beide richtingen, deels antwoord op [#45](#)
- Verdieping loopt in milestone [Requirementsboom doorontwikkelen](#)

Loop het wensen- en eisenpakket door

Voordat we gaan bouwen moeten we scherp hebben wat we willen en wat we moeten kunnen.

Drie vragen, via PR 82

- Wat mis je?
- Wat staat er goed?
- Is dit de juiste vorm?

Hulp bij het doorlopen

- Een sessie van een uur per leverancier, via Teams
 - De wekelijkse inloop op vrijdag
- 


DEEL 2

Branching en release




Branchmodel

Voorstel, Public PR 81

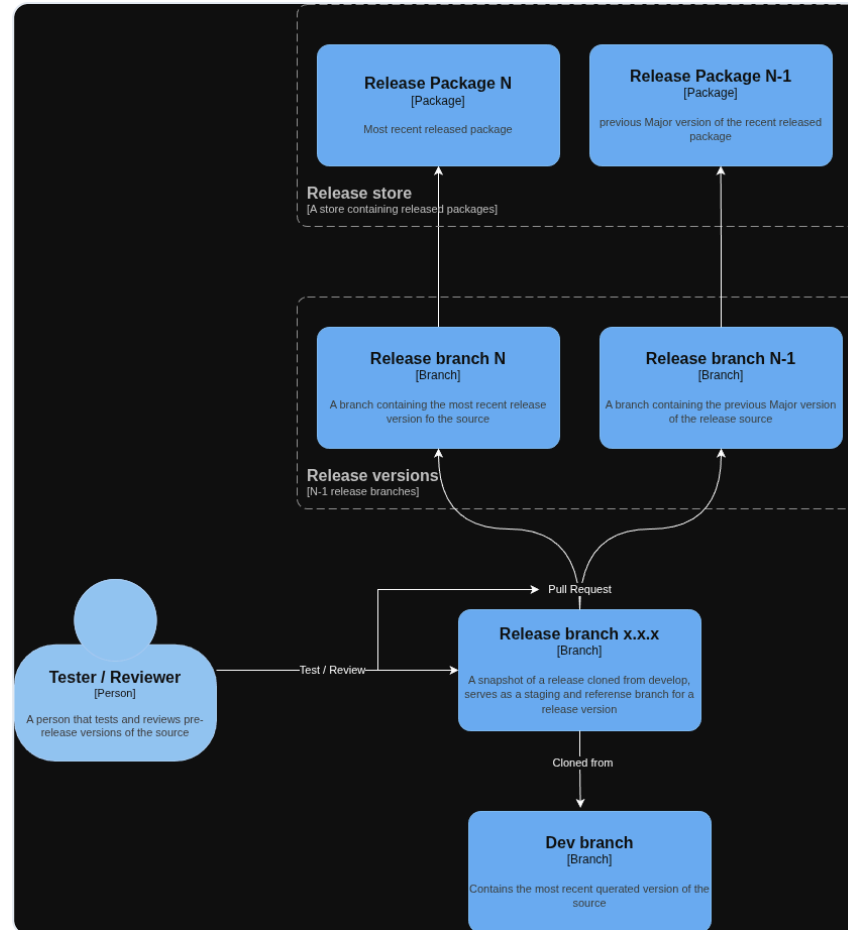

Van bron naar releasepakket



- Feature branch met pull request naar dev: de interne review
- Dev wordt gekloond naar een release branch, met alle bronbestanden erin
- Vanaf die release branch een pull request ter review voor de kerngroep techniek
- Na akkoord landen de bronbestanden op release branch N; de vorige blijft als N-1 staan
- Daarna start de CI de build; de bronbestanden blijven refereerbaar ([#46](#))
- De build levert ook het volledige document als markdown, zodat twee versies naast elkaar te leggen zijn

Wat is een pull request

- Een voorstel tot wijziging, met de aanleiding erbij
- Regel voor regel te bekijken en van commentaar te voorzien
- Automatische controles draaien mee en moeten slagen
- Pas na goedkeuring gaat de wijziging erin



DEMO

Reviewen via een pull request



Reviewen in vier stappen

1

Opgemaakte weergave van de wijziging

2

Commentaar per regel

3

Review indienen

4

Automatische controles: werken de verwijzingen nog

De controles groeien mee: verwijzingen, diagrammen tegen de schema's, navigeerbaarheid van de boom.



Afspraken bij een pull request-review

Status: concept

VOORZET	
Goedkeuringen	Minimaal een per leverancier die de koppeling bouwt, plus een vanuit de sector
Tester	Automatische controles, aangevuld met een mens die de testgevallen naloopt
Reviewer	Een ander persoon dan de tester, beoordeelt de inhoud
Termijn	Twee weken, tot de volgende sessie
Nooit	Een review door de maker van de wijziging

BESLUIT NODIG OP zijn we het eens met dit concept?

Openstaande punten

	VERVOLGACTIE
Versionering per koppeling (#47)	Voorstel eerst intern in het kernteam, daarna als PR hierheen
Meerdere instanties van een referentiecomponent (meta #80)	Uitwerken, nog geen uitspraak
Keuzes en regelsets (#74)	Keuzeregel-typologie toetsen aan echte scenario's
Informatiemodel voor payloads	Issue aanmaken, dan agenderen

INPUT GEVRAAGD waar ligt de prioriteit, en welke issues missen we nog

Gevraagd

REVIEW de requirementsboom in PR 82: welke epics, features, stories en functionele eisen mis jij? Tot de volgende sessie

BESLUIT de afspraken voor een pull request-review, en de prioritering van de openstaande punten

INPUT welke issues missen we nog

LEZEN de architectuurbesluiten en de kaderscenario's; alle besluiten staan op voorstel, dus commentaar telt nog

Vervolg

Volgende sessie:

- Versioneringsvoorstel als pull request
- Uitkomst van de review op v0.0.2
- De issues die vandaag ontbraken

Over drie maanden: start bouw op een eerste betaversie van de koppelvlakken OC naar SIS, OC naar P&R en OC naar LMS.


Commentaar op een release: in de pull request. Nieuw punt: als issue op github.com/Npuls-OKx/Public



Hoe gaat het?

- Welk cijfer geef je de voortgang, en waarom?
- Wat ging er goed?
- Wat kan er beter?





Npuls

