Npuls

Product breakdown en projectopzet

Van leerroute tot een koppelvlakspecificatie per keten, en wat het project daarvoor nodig heeft

OKx-techniek · programma- en projectleiding · november 2026

Doel

1

Duidelijkheid over waar we nu staan

Product breakdown, slide 3 en 4

2

Een consistente projectplanning

Backlog en schatting, slide 5 en 6

3

Inzicht in wat het project nodig heeft

Rollen, capaciteit en november, slide 7 tot en met 10

Product breakdown


Projectmanagement · **Domein** · **Solution** · **Eindproduct**

Doorgetrokken pijl: levert inhoud voor

Gestippelde lijn: onderdeel van

Getal in een blok: prioriteit, 1 is eerst

Op ware grootte in meta: architecture/product-breakdown

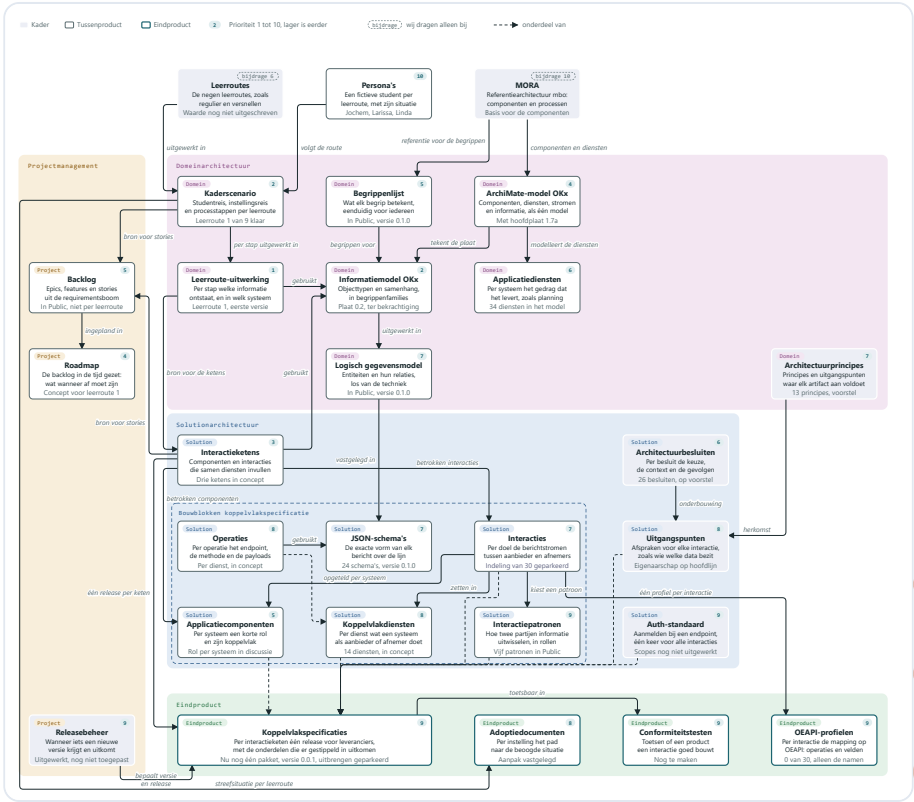

Van leerroute tot specificatie

Leerroute-uitwerking

Per stap van de studentreis: welke informatie ontstaat, en in welk systeem

→

Interactieketens

Onderwijsaanbod, student-instroom en bijsturen, uit leerroute 1

→

Specificatie per keten

Eigen koppelvlakspecificatie met eigen versiebeheer, uit generieke bouwblokken: interacties, operaties, koppelvlakdiensten, JSON-schema's, applicatiecomponenten

Eén koppelvlakspecificatie per interactieketen, met een eigen versie en release.

Backlog langs de product breakdown

Leerroute	**Leerroute 1**
Interactieketen	**Onderwijsaanbod**
Specificatie	Koppelvlakspecificatie onderwijsaanbod, v0.x.x
Bouwblok	Interacties, koppelvlakdiensten, operaties, JSON-schema's, applicatiecomponenten
Taak	Uitwerken, review en release, elk met een schatting
Interactieketen	**Student-instroom**, zelfde opbouw
Interactieketen	**Bijsturen**, zelfde opbouw

Van backlog naar roadmap en capaciteit

Backlog
Alle taken per leerroute en interactieketen

→

Schatting
Werklast per taak, door het team dat het werk doet

→

Roadmap
Wat wanneer af is, met een release per keten


→

Capaciteit
FTE per rol, en wat er ontbreekt

Tot dan: een schatting op rekenregels

WERK	BEZETTING	DOORLOOPTIJD
Leerroute uitwerken	1 solutionarchitect, 1 business-analist, 0,5 domeinarchitect	4 weken
Variant van een leerroute	hetzelfde team	2 weken per variant
Interactieketen tot specificatie	1 solutionarchitect	2 weken per keten
Reviewronde per keten	0,5 solutionarchitect, 0,5 business-analist	2 weken
Backlog, roadmap en releases	0,2 productowner	doorlopend

Benodigde rollen en wie ze dekt

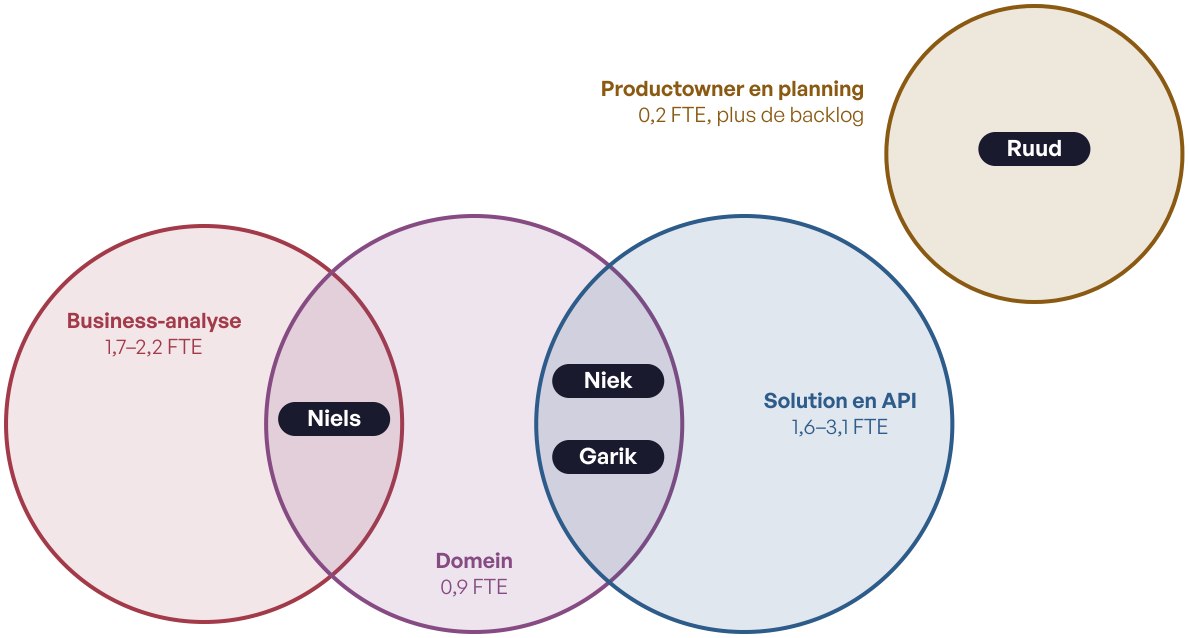

Nodig tot eind Q1 2027, geschat

4,9–6,9

FTE technisch, met stakeholdercontact

Beschikbaar, hoogstens

2,8

FTE technisch: Garik 0,8, Niek en Niels voltijd

Overlap is vervanging, geen extra capaciteit: wie domein doet, doet in die uren geen solution of business-analyse.

Stakeholdercontact: iedereen besteedt ongeveer een dag per week aan instellingen en leveranciers.

Capaciteit: schatting tot eind Q1 2027

LEERROUTE 1, REGULIER	FTE-WEKEN
Anker, scenario 1.1 uitwerken	10
Scenario's 1.2 tot en met 1.4	15
Keten onderwijsaanbod tot specificatie	4
Keten student-instroom tot specificatie	4
Keten bijsturen tot specificatie	4
Ketenwerk door de scenario's	0–12
Subtotaal leerroute 1	**37–49**

LEERROUTE 2, TEMPORISEREN	FTE-WEKEN
Anker, scenario 2.1 uitwerken	10
Scenario's 2.2 tot en met 2.4	15
Keten onderwijsaanbod, wijziging	0–4
Keten student-instroom, wijziging	0–4
Keten bijsturen, wijziging	0–4
Ketenwerk door de scenario's	0–12
Subtotaal leerroute 2	**25–49**

Gezamenlijk: basis, productowner, stakeholders, backlog

33,8

Totaal, in FTE-weken

96–132

Nodig technisch, zonder Ruud

4,9–6,9 FTE

Beschikbaar technisch

2,8 FTE

Schatting op de rekenregels van slide 6. Ketenwerk van leerroute 2 en de scenario's: van niets tot een volle keten. Stakeholders: een dag per week per persoon. Backlog in november: Garik 0,5, Niek en Niels 0,1.

Projectopzet november

Niek

Leerroute 1, solution; 0,1 FTE backlog en planning

Niels

Leerroute 1, business-analyse; 0,1 FTE backlog en planning

Garik

0,5 FTE backlog en planning, vormgeven en verfijnen met het team; daarnaast leerroute 1

Ruud

Productowner; 0,1 FTE om backlog en planning te bespreken

WEEK	BACKLOG EN PLANNING	LEERROUTE 1	WIE
46 · 9–13 nov	Opbouw van de backlog vastleggen; plek kiezen	Uitwerken	Garik, met Ruud
47 · 16–20 nov	Backlog vullen voor de drie ketens	Uitwerken	Garik, met Niek en Niels
48 · 23–27 nov	Werklast per taak schatten	Uitwerken	Garik, met het team
49 · 30 nov–4 dec	Roadmap en capaciteit afleiden; backlog bijwerken met de ketens uit de uitwerking	Uitwerken	Garik, met Ruud

Begin december: een backlog voor leerroute 1 met een schatting per taak, en daaruit de roadmap en de capaciteit per rol. Leerroute 1 krijgt in november minder dan de 2,5 FTE uit de rekenregel.

Besluit nodig op

BESLUIT Akkoord op de opzet: de product breakdown als structuur, de backlog per leerroute en keten, en een release per keten

BESLUIT Beschikbaarheid: per persoon vastleggen hoeveel FTE Ruud, Garik, Niek en Niels per maand aan OKx-techniek besteden

BESLUIT Extra capaciteit: 2 tot 4 FTE erbij voor twee leerroutes tot eind Q1 2027, een tweede leerrouteteam, en later test en adoptie



Npuls

CC BY SA
